



Jahr 1 - Beginn Abbau Abschnitt Ia

Abschnitt Ia: Rodung, Abbau (Jahr 1 bis 4) mit anschließender Verfüllung (bis Jahr 5)
 Abschnitt Ib: Erhalt des Bestandes
 Abschnitt II: Erhalt des Bestandes
 Abschnitt III: Erhalt des Bestandes

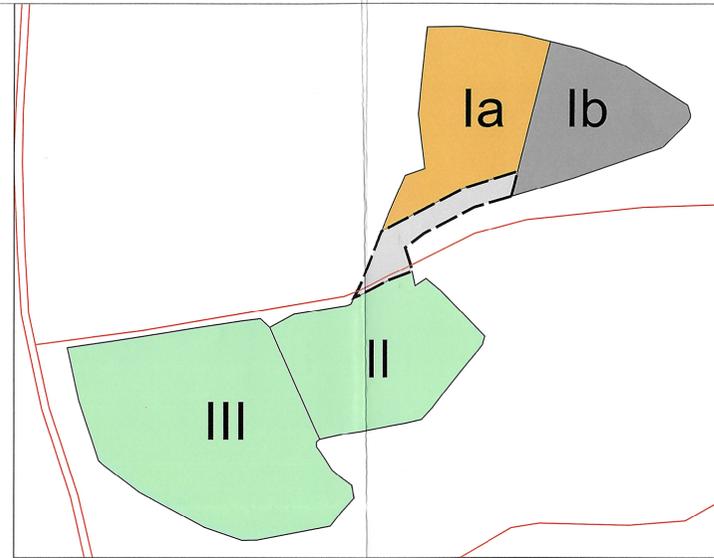


Jahr 4 - Beginn Abbau Abschnitt Ib

Abschnitt Ia: Restabbau (bis Jahr 4) und Verfüllung (bis Jahr 5)
 Abschnitt Ib: Rodung, Abbau (Jahr 4 bis 7) mit anschließender Verfüllung (bis Jahr 8)
 Abschnitt II: Erhalt des Bestandes
 Abschnitt III: Erhalt des Bestandes

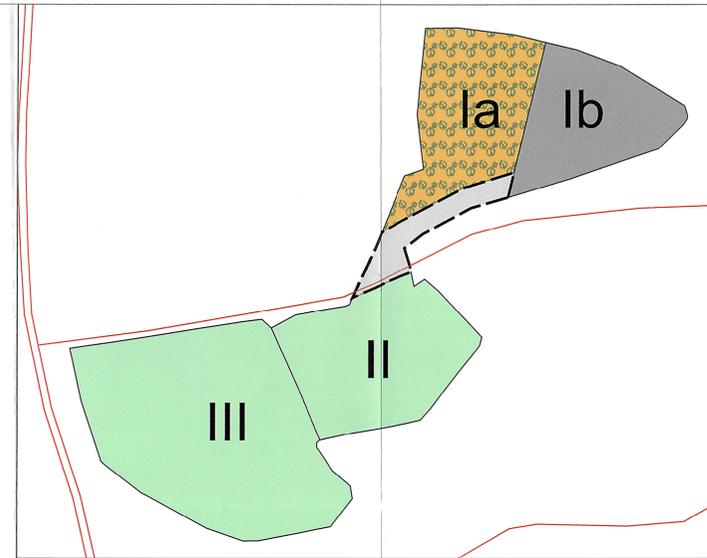


Jahre 5 & 6 - Rekultivierung Abschnitt Ia

Abschnitt Ia: Restverfüllung (Jahr 5), Aufforstung und Anlage Ersatzhabitate Eidechsen
 Abschnitt Ib: Abbau (bis Jahr 7) und Verfüllung (bis Jahr 8)
 Abschnitt II: Erhalt des Bestandes, Vergrümmungsmaßnahmen Eidechsen (Jahr 5) und Umsiedlung Eidechsen (Jahr 6) nach Herstellung Ersatzhabitate in Abschnitt Ia
 Abschnitt III: Erhalt des Bestandes

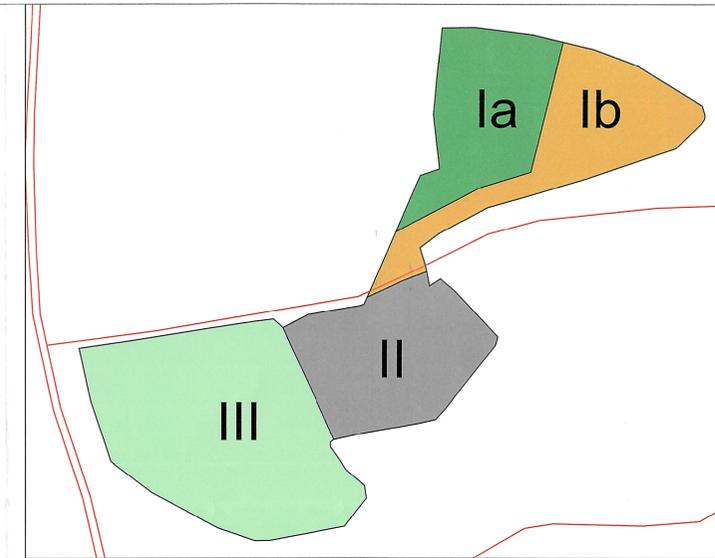


Jahr 7 - Beginn Abbau Abschnitt II

Abschnitt Ia: Rekultivierung abgeschlossen, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
 Abschnitt Ib: Restabbau (Jahr 7) und Verfüllung (bis Jahr 8)
 Abschnitt II: Rodung, Abbau (Jahr 7 bis 10) mit anschließender Verfüllung (bis Jahr 11)
 Abschnitt III: Erhalt des Bestandes

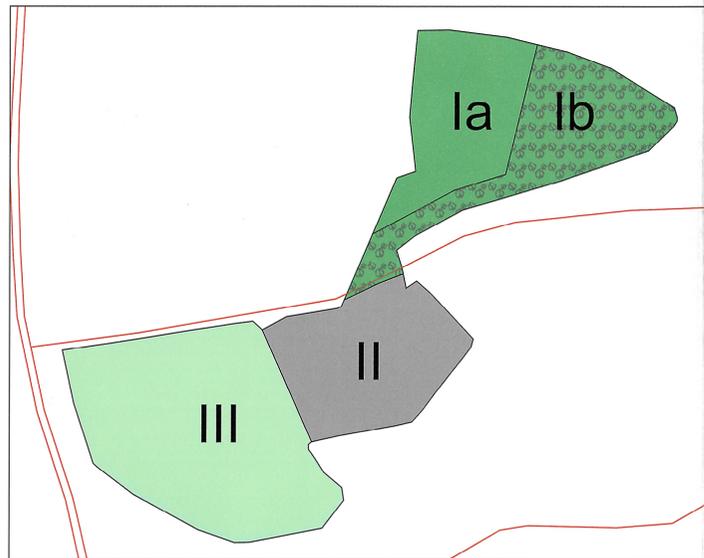


Jahr 9 - Rekultivierung Abschnitt Ib

Abschnitt Ia: Rekultivierung abgeschlossen, Entwicklungs- und Unterhaltungspflege
 Abschnitt Ib: Aufforstung
 Abschnitt II: Abbau (bis Jahr 10) und Verfüllung (bis Jahr 11)
 Abschnitt III: Erhalt des Bestandes

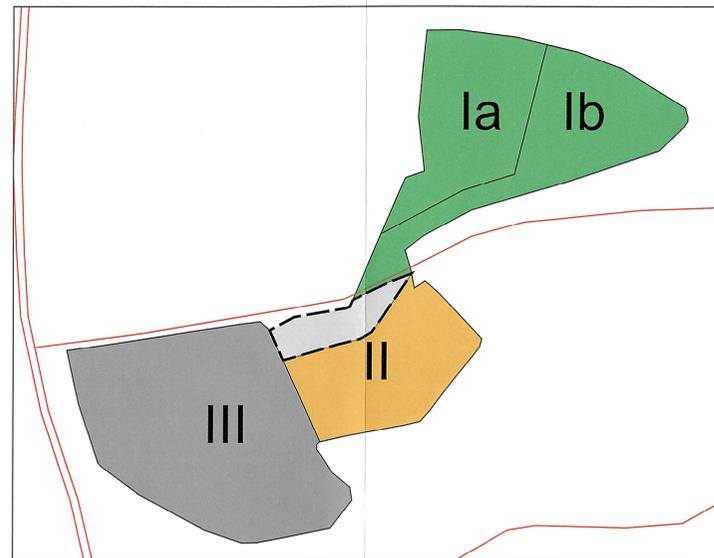


Jahr 10 - Beginn Abbau Abschnitt III

Abschnitt Ia: Rekultivierung abgeschlossen, Unterhaltungspflege
 Abschnitt Ib: Rekultivierung abgeschlossen, Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
 Abschnitt II: Restabbau (Jahr 10) und Verfüllung (bis Jahr 11)
 Abschnitt III: Rodung, Abbau (Jahr 10 bis 18) mit anschließender Verfüllung (bis Jahr 19)

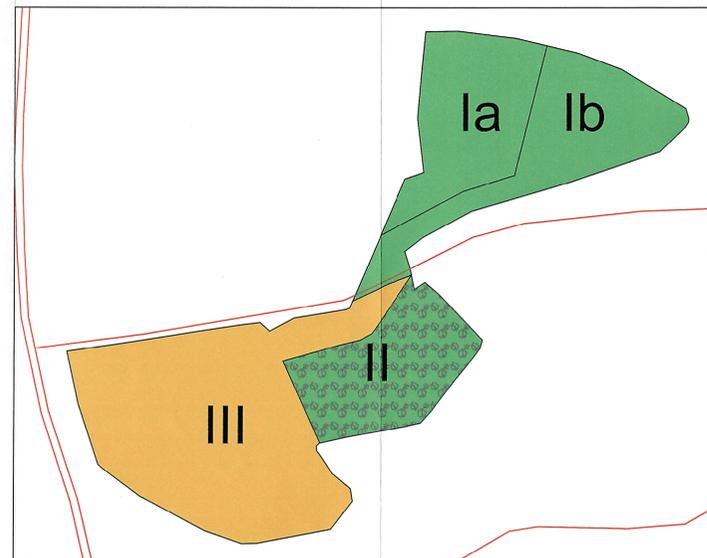

Jahr 12 - Rekultivierung Abschnitt II

Abschnitt Ia: Rekultivierung abgeschlossen, Unterhaltungspflege
 Abschnitt Ib: Rekultivierung abgeschlossen, Unterhaltungspflege
 Abschnitt II: Aufforstung und Anlage Rohbodenstandorte
 Abschnitt III: Abbau (bis Jahr 18) und Verfüllung (bis Jahr 19)

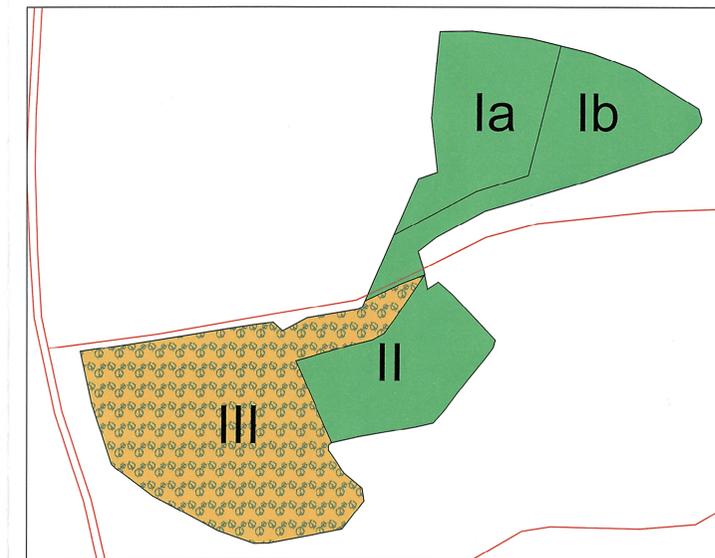

Jahr 19 & 20 - Rekultivierung Abschnitt III

Abschnitt Ia: Rekultivierung abgeschlossen, Unterhaltungspflege
 Abschnitt Ib: Rekultivierung abgeschlossen, Unterhaltungspflege
 Abschnitt II: Rekultivierung abgeschlossen, Unterhaltungspflege
 Abschnitt III: Restverfüllung (Jahr 19) und Aufforstung sowie Anlage Rohbodenstandorte (bis Jahr 20), anschließend Fertigstellungs- und Entwicklungspflege (bis Jahr 25)

- I / II / III Nummer Abbaubeschnitt
- Baufeldfreimachung, Rodung, Abbau
- Erhalt Bestand
- Restabbau und Verfüllung
- Restverfüllung und Aufforstung
- Aufforstung
- Rekultivierung abgeschlossen, Entwicklungs- und Unhaltungspflege
- Zufahrt zu Abschnitten

Eingang

20. Dez. 2022

Landratsamt Aichach-Friedberg
 Untere Bauaufsichtsbehörde

Bauherr: **Richard Schulz Tiefbau GmbH & Co. KG**
 Beethovenstraße 4
 86633 Neuburg

Bauvorhaben: **Kies/Sandabbau und Erdauffüllung Markt Pöttmes**
 Flur-Nr. 2040 und 2041, Gemarkung Pöttmes

Planart: **Ablaufplan**

Maßstab: **1 : 2.500**

Beilage: **17**

Bearbeitet:
 Gezeichnet:
 Geprüft:
 Plan-Nr.:

HB/YZK/IAS/HL
 HL
 Brugger



Datum: 25.10.2018
 Geändert: 16.12.2022
 Plangröße: 435 x 985 mm
 Datei / Pfad: Q:\Objekt\1517\Pläne\1517_

brugger landschaftsarchitekten
 stadtplaner_ökologen
 Deuringerstr. 5a, 86651 Aichach
 Telefon: 08251 / 8769-0 Fax: 8768-88
 info@brugger-landschaftsarchitekten.de www.bugger-landschaftsarchitekten.de
