


Entnahmestelle:	Tiefe:	Entnahmedatum:	Bodenart:
Dep. St. Augustin	oben	15.03.2022	
Prüfdatum:	Prüfbericht Nr.:	Labornummer:	erstellt (Datum+Kürzel):
04-2022	Kwr_01B	33837	28.04.2022, KS
Bemerkungen:	Dichtungsmaterial Randgraben SO		

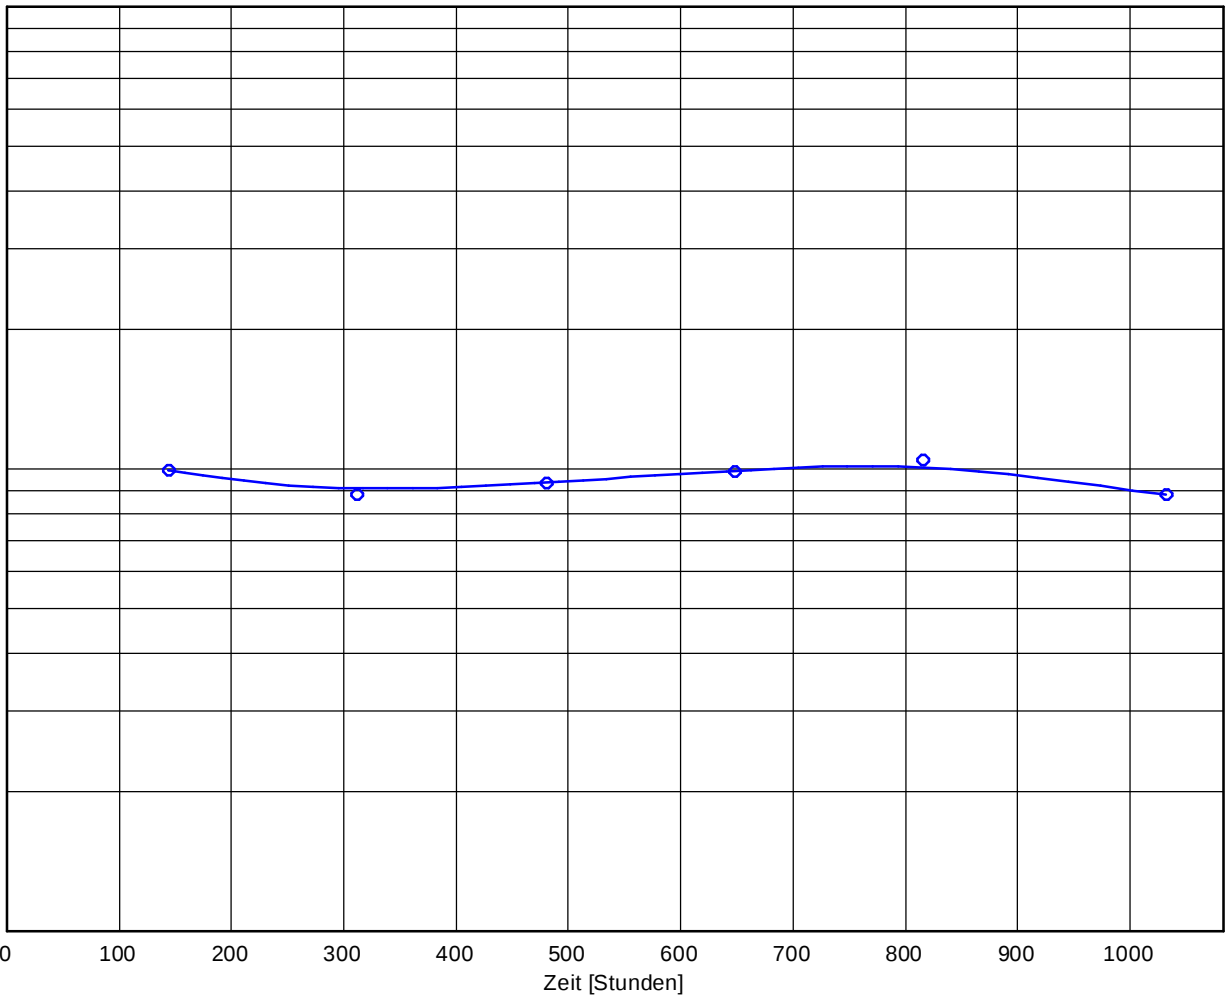

Versuch-Nr.:	1
Signatur:	
Versuchstyp:	Konstante Druckhöhe
Sättigungsdruck:	
Hydraul. Gefälle:	29.97
Probendurchmesser:	9.90
Probenhöhe:	10.51
Probenfläche:	76.98
Anfangswassergehalt [%]:	185.8
Endwassergehalt [%]:	
Anfangsfeuchtdichte [Mg/m³]	1.266
Anfangstrockendichte [Mg/m³]	0.443
Art des Versuchswassers:	entlüftetes Leitungswasser
mittlere Labortemperatur [°C]:	20.0
Durchlässigkeit:	9.5 · 10 ⁻¹¹

Auftraggeber:		CDM smith CDM Smith Consult GmbH Am Umweltpark 3-5 44793 Bochum	
Projekt:			
Dep. St. Augustsin Stilllegung BA IV			
Durchlässigkeit nach DIN ENISO 17892-11:2019			
Permeameter mit flexibler Wand			
Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die geprüften Gegenstände			
Projekt Nr.:		Bericht Nr.:	
102719		5.8	
Leiter PL		☐	
Stellvertreter		☐	
