

Genehmigungsplanung

Umgestaltung Dieskaustraße zwischen Huttenstraße und Kulkwitzer Straße

P-Nr. 90095

Maßnahmenverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Maßnahme 1 V _{CEF} : Jahreszeitliche Steuerung der Baufeldfreimachung (01. März bis 30. September) und Begutachtung zu fällender Höhlenbäume auf Tierbesatz bzw. aktuelle Besiedlung unmittelbar vor der Fällung	2
Maßnahme 2 V: Baumschutz im Baufeld.....	5
Maßnahme 1 A: Entsiegelung	7
Maßnahme 2 A: Pflanzung von Bäumen als straßenbegleitendes Großgrün.....	9
Maßnahme 1 E: Neuanlage von Waldrand (Ökokontomaßnahme).....	11

Maßnahme 1 V_{CEF}: Jahreszeitliche Steuerung der Baufeldfreimachung (01. März bis 30. September) und Begutachtung zu fällender Höhlenbäume auf Tierbesatz bzw. aktuelle Besiedlung unmittelbar vor der Fällung

Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung <i>Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt zwischen Huttenstraße und Kulkwitzer Straße P-Nr. 90095</i>	Vorhabenträger <i>Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH</i>	Maßnahmen-Nr. 1 V_{CEF}
Bezeichnung der Maßnahme <i>Vermeidungsmaßnahme</i> Jahreszeitliche Steuerung der Baufeldfreimachung (01. März bis 30. September) und Begutachtung zu fällender Höhlenbäume auf Tierbesatz bzw. aktuelle Besiedlung unmittelbar vor der Fällung		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme Zusatzindex CEF= funktionserhaltende Maßnahme
zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: Unterlagen-Nr.: B 09.2 Blatt-Nr.: 1, 3-8		
Lage der Maßnahme <u>Jahreszeitliche Steuerung der Baufeldfreimachung: gesamter Gehölzbestand entlang der Baumaßnahme Begutachtung zu fällender Bäume (vgl. B 09.2 Blatt 7; Gemarkung Großschocher, Flurstück 651):</u> - Kleiner Baum ganz im Norden der zu fällenden Baumreihe (Abbildung 1) - vorgelagerter größerer Baum (Abbildung 2)		
Begründung der Maßnahme		
Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort <i>Vermeidung des Eintritts artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände</i> Im Rahmen der bauvorbereitenden Maßnahmen ist die Beseitigung von Gehölzstrukturen im Baufeld nicht vermeidbar (Baufeldfreimachung). Diese Strukturen stellen potentielle Bruthabitate für verschiedene, wenig anspruchsvolle Vogelarten dar. Eine Verletzung und/ oder Tötung von Tieren aufgrund der geplanten Baufeldräumung (möglicher Verlust besetzter Nester) ist daher nicht von vornherein auszuschließen. Mit der Bauzeitenregelung wird der Verlust besetzter Nester vermieden und die Erfüllung des Verbotstatbestandes der Tötung oder Verletzung tritt nicht ein.		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen		
-		
Zielkonzeption der Maßnahme		
Vermeidung der Beschädigung von Fortpflanzungsstätten sowie der Gefährdung von Individuen wildlebender Vogelarten und ihren Entwicklungsstadien, insbesondere nicht flügge Jungvögel oder Eier und Nester im Bereich des Baufeldes oder der Baustelleneinrichtungsfläche		
<input checked="" type="checkbox"/>	Vermeidung für Konflikt	artenschutzrechtliche Verbotstatbestände (Konflikt B1, B2)
<input type="checkbox"/>	Ausgleich für Konflikt	-
<input type="checkbox"/>	Ersatz für Konflikt	-
<input type="checkbox"/>	Maßnahme zur Schadensbegrenzung für	
<input type="checkbox"/>	Maßnahme zur Kohärenzsicherung für	
<input type="checkbox"/>	CEF-Maßnahme für <i>die Vermeidung des Eintretens artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände</i>	
<input type="checkbox"/>	FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für	
Umsetzung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme Zum Schutz der ubiquitären Vogelarten ist die jahreszeitliche Steuerung des Baubeginns erforderlich. Die Baufeldfreimachung geschieht außerhalb der Brutzeit, also im Winterhalbjahr bis Ende Februar (nicht in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September). So wird dafür gesorgt, dass sich die Vögel während der Bauzeit nicht im Störradius ansiedeln bzw. nicht plötzlich während der Brutzeit vom Bauvorhaben gestört werden. Es wird davon ausgegangen, dass sie sich ihren Nestplatz während der Bauzeit im Umfeld suchen können.		

Vor Ort wurden außerdem an zwei Bäumen potenzielle Höhlungen in Form von beginnenden Aushöhlungen an abgefaulten Asthöhlen beobachtet. Diese sind vorsorglich vor der Fällung der Bäume zu kontrollieren.

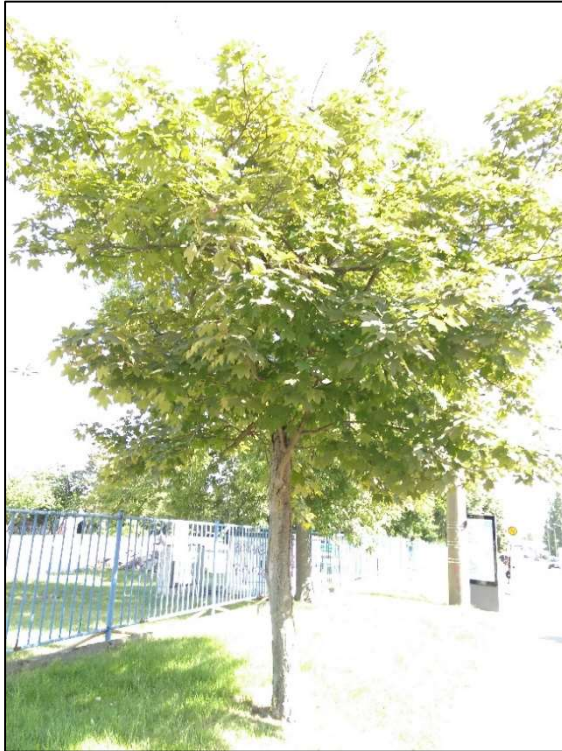


Abbildung 1: kleiner Baum ganz im Norden der zu fällenden Baumreihe (Blatt 7)

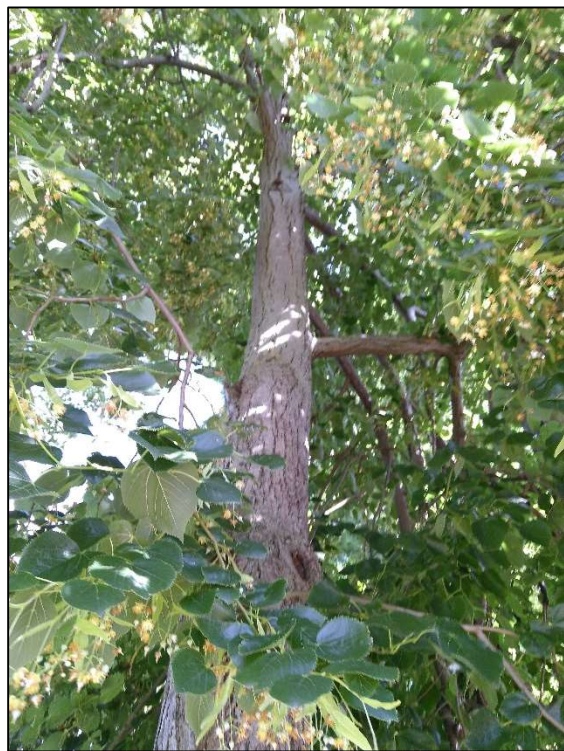


Abbildung 2: vorgelagerter größerer Baum (Blatt 7)

Gesamtumfang der Maßnahme

Gehölzbestände im Baufeld /
Kontrolle der Höhlen und Astlöcher: 2 Bäume

Maßnahmenblatt			
Projektbezeichnung <i>Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt zwischen Huttenstraße und Kulkwitzer Straße P-Nr. 90095</i>		Vorhabenträger <i>Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH</i>	
		Maßnahmen-Nr. 1 V_{CEF}	
Zielbiotop:	--	<i>ha / St. / m</i>	Ausgangsbiotop:
			--
			<i>ha / St. / m</i>
Zeitliche Zuordnung		<input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Beschreibung der Entwicklung und Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen			
-			
Hinweise zur Funktionskontrolle			
-			
Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung			
-			

Maßnahme 2 V: Baumschutz im Baufeld

Maßnahmenblatt			
Projektbezeichnung <i>Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt zwischen Huttenstraße und Kulkwitzer Straße P-Nr. 90095</i>		Vorhabenträger <i>Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH</i>	
		Maßnahmen-Nr. 2 V	
Bezeichnung der Maßnahme <i>Vermeidungsmaßnahme</i> Baumschutz im Baufeld: Kronen-, Stamm- und Wurzelschutz für betroffene Bäume gemäß DIN 18920 und RAS-LP 4		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme Zusatzindex CEF= funktionserhaltende Maßnahme	
zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: Unterlagen-Nr.: B 09.2 Blatt-Nr.: 2-5, 8			
Lage der Maßnahme Straßenbäume entlang der Dieskaustraße, Albrecht-Vollsack-Straße, Bismarckstraße Gemarkung Großzschocher folgende Flurstücke: 235/6, 54, 55, 1215, 172/1, 125, 136/24, 143/c, 867, 1714, 1735, 1737, 136/10, Gemarkung Kleinzschocher auf folgenden Flurstücken: 943/2, 189			
Begründung der Maßnahme			
Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort Vermeidung der Beschädigung von Gehölzen im Baufeldrandbereich			
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen Straßenbäume			
Zielkonzeption der Maßnahme Schutz vorhandener Bäume vor mechanischer Beeinträchtigung (Verdichtungen im Wurzelbereich, mögliche Wurzelbeschädigungen)			
<input checked="" type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <i>mechanische Beeinträchtigungen der Gehölze am Baufeldrand</i> <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt - <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt -			
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für			
Umsetzung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme Im Baustellenbereich sind Schutzmaßnahmen hinsichtlich der angrenzenden Straßenbäume in der Dieskaustraße vorgesehen. Diesbezüglich sind geeignete Kronen-, Stamm- und Wurzelschutzmaßnahmen im vorhandenen Wurzelraum der Bäume im unmittelbaren Umfeld der Haltestelle nach DIN 18920 und RAS-LP 4 durchzuführen. Das Hauptziel ist es straßennahe Bäume, die im Zuge der Baumaßnahme nicht beseitigt werden müssen, vor Schäden zu bewahren und Beeinträchtigungen auszuschließen.			
Gesamtumfang der Maßnahme			
Zielbiotop: -- ha / St. / m		Ausgangsbiotop: -- ha / St. / m	
Hinweise zur landschaftspflegerischen Bauausführung			

Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung <i>Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt zwischen Huttenstraße und Kulkwitzer Straße P-Nr. 90095</i>	Vorhabenträger <i>Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH</i>	Maßnahmen-Nr. 2 V
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten	
Beschreibung der Entwicklung und Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen -		
Hinweise zur Funktionskontrolle -		
Weitere Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung -		

Maßnahme 1 A: Entsiegelung

Maßnahmenblatt			
Projektbezeichnung <i>Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt zwischen Huttenstraße und Kulkwitzer Straße P-Nr. 90095</i>	Vorhabenträger <i>Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH</i>	Maßnahmen-Nr. 1 A	
Bezeichnung der Maßnahme <i>Ausgleichsmaßnahme</i> Entsiegelung der Baumscheiben für die geplanten Neupflanzungen und Anlage von Verkehrsbegleitgrün im versiegelten Straßenraum		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme	
zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: Unterlagen-Nr.: B 09.2 Blatt-Nr.: 3, 6, 7			
Lage der Maßnahme Entlang der Dieskaustraße			
Begründung der Maßnahme			
Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort Flächeninanspruchnahme durch Voll- und Teilversiegelung			
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen Dieskaustraße			
Zielkonzeption der Maßnahme <ul style="list-style-type: none"> - Entsiegelung von Straßenfläche und Wiederherstellung von Bodenfunktionen, Förderung des Bodenlebens - Erhöhung der Versickerungsfähigkeit, Erosionsschutz und strukturelle Aufwertung, - Ausgleich der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes (Neupflanzung von Bäumen) 			
<input type="checkbox"/>	Vermeidung für Konflikt	-	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ausgleich für Konflikt	Bo, Gw,	
<input type="checkbox"/>	Ersatz für Konflikt		
<input type="checkbox"/>	Maßnahme zur Schadensbegrenzung für		
<input type="checkbox"/>	Maßnahme zur Kohärenzsicherung für		
<input type="checkbox"/>	CEF-Maßnahme für		
<input type="checkbox"/>	FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Umsetzung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme Entsiegelung der Baumscheiben für die geplanten Neupflanzungen im versiegelten Straßenraum: In Vorbereitung für die Maßnahme 2 A werden für die Baumpflanzungen, vormals versiegelte Flächen entsiegelt. Des Weiteren werden ehemals versiegelte Straßenflächen (917 m ²) und teilversiegelte Nebenflächen (253 m ²) in Grünflächen überführt (Verkehrsbegleitgrün), sowie versiegelte Fläche in teilversiegelte Flächen umgewandelt (48 m ²). Die Entsiegelung führt zu einer Aufwertung der Schutzgüter Boden und Wasser.			
Gesamtumfang der Maßnahme		560 m ² (für einen Großteil der Bäume von – Maßnahme 2 A – gilt nicht für alle, da nicht alle Bäume auf vorherige versiegelte Fläche gepflanzt werden) 917 m ² (Entsiegelung) 301 m ² (Teilentsiegelung)	
Auszug aus Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz:			
Biotoptyp (vor Eingriff)	Biotoptyp (nach Eingriff)	Fläche [m²]	Gemarkung / Flurstück
Huttenstraße (Blatt 1)			
<i>Straße, Weg (vollversiegelt)</i>	<i>Baumreihe (4 Stück)</i>	24	Großzschocher / 193
Nördl. Ecke Huttenstraße bis nördl. Ecke Dieskaustraße I (Blatt 2)			
<i>Straße, Weg (vollversiegelt)</i>	<i>Baumreihe (2 Stück)</i>	10	Großzschocher / 867

Maßnahmenblatt			
Projektbezeichnung <i>Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt zwischen Huttenstraße und Kulkwitzer Straße P-Nr. 90095</i>	Vorhabenträger <i>Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH</i>	Maßnahmen-Nr. 1 A	
Nördl. Ecke Dieskaustraße I bis südl. Ecke Kunzestraße (Blatt 3)			
<i>Straße, Weg (vollversiegelt)</i>	<i>Baumreihe (4 Stück)</i>	<i>20</i>	<i>Großzschocher / 867, 123, 125, 1198</i>
<i>Parkplatz (versiegelt)</i>	<i>Verkehrsbegleitgrün</i>	<i>60</i>	<i>Großzschocher / 126/4</i>
<i>Parkplatz (versiegelt)</i>	<i>Baumreihe (4 Stück)</i>	<i>24</i>	<i>Großzschocher / 126/4</i>
Südl. Ecke Kunzestraße bis Ecke A.-Vollsack-Straße (Blatt 4)			
<i>Straße, Weg (vollversiegelt)</i>	<i>Baumreihe (10 Stück)</i>	<i>60</i>	<i>Großzschocher / 867, 136/20</i>
A.-Vollsack-Straße bis nördl. Bahnlinie Leipzig-Plagwitz (Blatt 5)			
<i>Straße, Weg (vollversiegelt)</i>	<i>Baumgruppe (8 Stück)</i>	<i>42</i>	<i>Großzschocher / 867, 143b, 143c</i>
Nördl. Bahnlinie Leipzig-Plagwitz bis nördl. Einfahrt Radrennbahn (Blatt 6)			
<i>Straße, Weg (vollversiegelt)</i>	<i>Allee (26 Stück)</i>	<i>195</i>	<i>Großzschocher / 868/1</i>
Nördl. Einfahrt Radrennbahn bis nördl. Pörstener Straße (Blatt 7)			
<i>Straße, Weg (teilversiegelt)</i>	<i>Verkehrsbegleitgrün</i>	<i>253</i>	<i>Großzschocher / 868/1, 868/2, 651</i>
<i>Straße, Weg (vollversiegelt)</i>	<i>Allee (14 Stück)</i>	<i>93</i>	<i>Großzschocher / 868/1 Kleinzschocher / 943/2, 196/7</i>
<i>Platz (versiegelt)</i>	<i>Verkehrsbegleitgrün</i>	<i>365</i>	<i>Großzschocher / 868/1, 868/2, 651</i>
<i>Platz (versiegelt)</i>	<i>Straße, Weg (teilversiegelt)</i>	<i>48</i>	<i>Großzschocher / 651</i>
<i>Straße, Weg (vollversiegelt)</i>	<i>Baumreihe (4 Stück)</i>	<i>24</i>	<i>Kleinzschocher 943/2, 196/10, 196/6</i>
Zielbiotop: <i>Baumreihen</i> <i>1.067,5 m²</i> <i>Allee</i> <i>Verkehrsbegleitgrün</i> <i>Straße, Weg (teilversiegelt)</i>		Ausgangsbiotop: <i>Straße, Weg (vollversiegelt)</i> <i>1.067,5 m²</i> <i>Parkplatz (versiegelt)</i> <i>Verkehrsbegleitgrün</i> <i>sonstige Plätze (unversiegelt) (0,5)</i>	
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten		
Beschreibung der Entwicklung und Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen Die einjährige Fertigstellungs- und zweijährige Entwicklungspflege Pflanzungen erfolgen gemäß der DIN 18916 „Pflanzen und Pflanzarbeiten“ in Verbindung mit der ZTV La-StB 05. -bei Bedarf zurückschneiden			
Hinweise zur Funktionskontrolle -			
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung -			

Maßnahme 2 A: Pflanzung von Bäumen als straßenbegleitendes Großgrün

Maßnahmenblatt			
Projektbezeichnung <i>Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt zwischen Huttenstraße und Kulkwitzer Straße P-Nr. 90095</i>	Vorhabenträger <i>Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH</i>	Maßnahmen-Nr. 2 A	
Bezeichnung der Maßnahme <i>Ausgleichsmaßnahme</i> Pflanzung von Bäumen als straßenbegleitendes Großgrün		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme	
zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: Unterlagen-Nr.: B 09.2 Blatt-Nr.: 1-7			
Lage der Maßnahme Entlang der Dieskaustraße			
Begründung der Maßnahme			
Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort Flächeninanspruchnahme durch Voll- und Teilversiegelung, bau- und anlagebedingte Rodung von Gehölzen			
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen Dieskaustraße			
Zielkonzeption der Maßnahme Die Maßnahme dient der Wiederherstellung von in Anspruch genommenen Biotopen bzw. Lebensraumfunktionen im Baufeld, Ausgleich von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, sowie Aufwertung des Bodens durch die Einzelpflanzungen (z.B.: Auflockerung durch Wurzeln)			
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input checked="" type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt B, Bo, L <input type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt			
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für			
Umsetzung der Maßnahme			
Beschreibung der Maßnahme Nach Abschluss der Baumaßnahmen und nach der Wiederherstellung der bauzeitlich genutzten Flächen erfolgen die Neupflanzungen von Laubbaumhochstämmen. Es sind standortgerechte Laubbaumarten zur Ergänzung der bestehenden Gehölzbestände zu verwenden. Verwendung von Hochstämmen mit mindestens 20 – 25 cm Stammumfang.			
Gesamtumfang der Maßnahme		88 Stk. H. (560 m²)	
<i>Auszug aus Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz:</i>			
Biotoptyp (vor Eingriff)	Biotoptyp (nach Eingriff)	Fläche [m²]	Gemarkung / Flurstück
Huttenstraße (Blatt 1)			
<i>Straße, Weg (vollversiegelt)</i>	<i>Baumreihe (4 Stück)</i>	24	<i>Großzschocher / 193</i>
Nördl. Ecke Huttenstraße bis nördl. Ecke Dieskaustraße I (Blatt 2)			
<i>Straße, Weg (vollversiegelt)</i>	<i>Baumreihe (2 Stück)</i>	10	<i>Großzschocher / 867</i>
Nördl. Ecke Dieskaustraße I bis südl. Ecke Kunzestraße (Blatt 3)			

Maßnahmenblatt			
Projektbezeichnung	Vorhabenträger		Maßnahmen-Nr.
Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt zwischen Huttenstraße und Kulkwitzer Straße P-Nr. 90095	Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH		2 A
Straße, Weg (vollversiegelt)	Baumreihe (4 Stück)	20	Großzschocher / 867, 123, 125, 1198
Parkplatz (versiegelt)	Baumreihe (4 Stück)	24	Großzschocher / 126/4
Südl. Ecke Kunzestraße bis Ecke A.-Vollsack-Straße (Blatt 4)			
Straße, Weg (vollversiegelt)	Baumreihe (10 Stück)	60	Großzschocher / 867,136/20
A.-Vollsack-Straße bis nördl. Bahnlinie Leipzig-Plagwitz (Blatt 5)			
Straße, Weg (vollversiegelt)	Baumgruppe (8 Stück)	42	Großzschocher / 867, 143b, 143c
Nördl. Bahnlinie Leipzig-Plagwitz bis nördl. Einfahrt Radrennbahn (Blatt 6)			
Verkehrsbegleitgrün	Baumreihe (1Stück)	5,5	Großzschocher / 651/b
Straße, Weg (vollversiegelt)	Allee (26 Stück)	195	Großzschocher / 868/1
Nördl. Einfahrt Radrennbahn bis nördl. Pörstener Straße (Blatt 7)			
Verkehrsbegleitgrün	Baumreihe (7 Stück)	38,5	Großzschocher / 651
sonstige Plätze (unversiegelt)	Baumreihe (4 Stück)	24	Großzschocher / 651
Straße, Weg (vollversiegelt)	Allee (14 Stück)	93	Großzschocher / 868/1 Kleinzschocher / 943/2, 196/7
Straße, Weg (vollversiegelt)	Baumreihe (4 Stück)	24	Kleinzschocher 943/2, 196/10, 196/6
Zielbiotop: Baumreihen und 560 m ² Alleen mit insgesamt 88 Bäumen		Ausgangsbiotop: Straße, Weg (vollversiegelt) 560 m ² Parkplatz (versiegelt) Verkehrsbegleitgrün sonstige Plätze (unversiegelt)	
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten		
Beschreibung der Entwicklung und Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen -bei Bedarf zurückschneiden			
Hinweise zur Funktionskontrolle -			
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung -			

Maßnahme 1 E: Neuanlage von Waldrand (Ökokontomaßnahme)

Maßnahmenblatt		
Projektbezeichnung <i>Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt zwischen Huttenstraße und Kulkwitzer Straße P-Nr. 90095</i>	Vorhabenträger <i>Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH</i>	Maßnahmen-Nr. 1 E
Bezeichnung der Maßnahme <i>Ersatzmaßnahme / Ökokontomaßnahme</i> Neuanlage von Waldrand		Maßnahmentyp V Vermeidungsmaßnahme A Ausgleichsmaßnahme E Ersatzmaßnahme G Gestaltungsmaßnahme
zum Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: Unterlagen-Nr.: B 19.1 Anhang II; B 09.1		
Lage der Maßnahme östlich von Wermsdorf / Wermsdorfer Wald (Gemarkung Wermsdorf, Flurstück 656)		
Begründung der Maßnahme		
Auslösende Konflikte / notwendige Maßnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standort Flächeninanspruchnahme durch Voll- und Teilversiegelung, bau- und anlagebedingte Rodung von Gehölzen		
Ausgangszustand der Maßnahmenflächen Konventionell bewirtschafteter Acker		
Zielkonzeption der Maßnahme Flächig bepflanzter Waldrand. Südlich wird ein zwei Meter breiter Streifen als Krausaum frei gelassen. Anschließend werden heimische Sträucher und Bäume zweiter Ordnung stufig bis zum Waldbestand hin ansteigend reihenweise gepflanzt. Folgende wärmeliebende Arten sind geplant: Deutscher Ginster, Rote Heckenkirsche, Kornelkirsche, Wildapfel, Wildbirne und Vogelkirsche. Die Maßnahme dient der Aufwertung von Acker, der Aufwertung des Bodens durch Ersatzpflanzungen (z.B.: Auflockerung durch Wurzeln) und der Aufwertung des Landschaftsbildes.		
<input type="checkbox"/> Vermeidung für Konflikt <input type="checkbox"/> Ausgleich für Konflikt <input checked="" type="checkbox"/> Ersatz für Konflikt B, Bo, L		
<input type="checkbox"/> Maßnahme zur Schadensbegrenzung für <input type="checkbox"/> Maßnahme zur Kohärenzsicherung für <input type="checkbox"/> CEF-Maßnahme für <input type="checkbox"/> FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für		
Umsetzung der Maßnahme		
Beschreibung der Maßnahme Nach einer Tiefenlockerung des Bodens erfolgt eine fünfjährige Anwuchsphase mit ein bis drei Kulturpflegen auf den Pflanzflächen. Dabei wird flächig kulturhemmender Bewuchs zurückgemäht und Pflanzenausfälle nachgebessert. Zum Schutz vor Wildverbiss wird die gesamte Fläche reh- und rotwildsicher gezäunt. Nach Sicherung der Kultur wird diese dauerhaft in Richtung eines stufig aufgebauten Waldrandes aus heimischen Sträuchern und Bäumen zweiter Ordnung entwickelt. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine Ökokontomaßnahme, sie ist eine Teilfläche einer Gesamtmaßnahme. Maßnahmenträger und Grundstückseigentümer der Fläche ist der Freistaat Sachsen, vertreten durch den Staatsbetrieb Sachsenforst – Forstbezirk Leipzig (Leiter Herr Andreas Padberg).		

Maßnahmenblatt			
Projektbezeichnung <i>Umgestaltung Dieskaustraße im Abschnitt zwischen Huttenstraße und Kulkwitzer Straße P-Nr. 90095</i>	Vorhabenträger <i>Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH</i>	Maßnahmen-Nr. 1 E	
Gesamtumfang der Maßnahme		520 m ² (Gesamtfläche: 2.828 m ²)	
Zielbiotop: <i>Waldrand heimischer Sträucher/sonstig wertvoller Gehölzbestand</i>	520 m ²	Ausgangsbiotop: <i>Intensiv genutzter Acker</i>	520 m ²
Zeitliche Zuordnung	<input type="checkbox"/> Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten <input type="checkbox"/> Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten <input checked="" type="checkbox"/> Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten		
Beschreibung der Entwicklung und Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen Ein bis drei Kulturpflegen, Mahd von kulturhemmendem Bewuchs, Ausgleich von Pflanzausfällen Unterhaltung durch den Staatsbetrieb Sachsenforst – Forstbezirk Leipzig			
Hinweise zur Funktionskontrolle Abnahme erfolgt durch die LVB GmbH und den Staatsbetrieb Sachsenforst – Forstbezirk Leipzig			
Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung Entfällt			
