



Pegel 26

GOK

BS 26



G1	0,00 0,40
G2	0,40 1,00
G3	1,00 1,50
G4	1,50 2,00
G5	2,00 3,00
G6	3,00 3,90

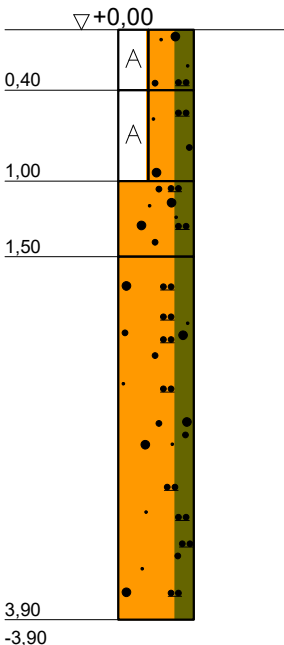


A (S, u), erdfeucht, [SU], gerundet, Wurzelreste, braun-dunkelbraun

A (S, u), erdfeucht, [SU], gerundet, 0,5-0,56 m Oberboden alt, braun

S, u', erdfeucht, (SU), gerundet, orange

S, u, erdfeucht, (SU), gerundet, rotbraun

kein weiterer Bohrfortschritt

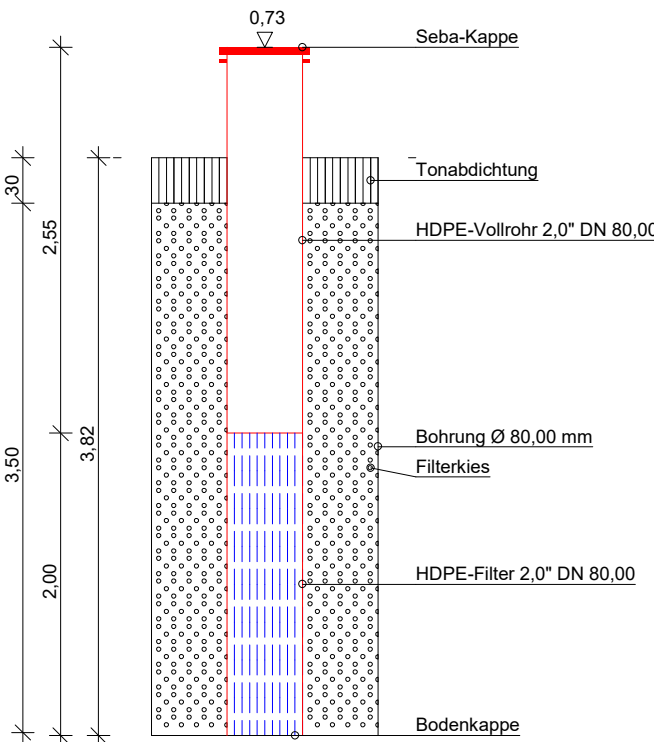

DR. SPANG

Ingenieurgesellschaft f. Bauwesen
Geologie und Umwelttechnik mbH

Bauvorhaben:
TENP III
Mittelbrunn - Klingenmünster

Auftraggeber:
Open Grid Europe GmbH

KLEINRAMMBOHRUNG + PEGEL

Anlage:	4.2 - BS-P 26
Projekt-Nr:	40.6722
Datum:	16.12.2020
Maßstab:	1 : 50
Bearbeiter:	Cris/Ruw
