



Messstelle	Rechtswert	Hochwert	Höhe ROK	Allzeit-Tief	Allzeit-Hoch	Δ_{max}	2018-IV	2019-I	2019-II	2019-III	2019-IV
GWM 1.02	4517184,6	5716573,4	95,76	83,94	86,77	2,83	84,52	83,94	84,17	84,15	84,13
GWM 2.02	4517346,2	5717004,7	95,82	81,13	83,36	2,23	81,52	81,36	81,22	81,22	81,13
GWM 3.02	4517349,1	5717251,4	92,75	77,52	81,25	3,73	78,00	77,90	77,80	77,60	77,52
GWM 4.02	4517747,8	5717196,6	91,90	75,06	77,85	2,79	75,30	75,10	75,08	75,09	75,06
GWM 5.02	4518001,7	5716992,2	88,82	73,46	73,86	0,40	73,56	73,46	73,48	73,52	73,57
GWM 6.02	4517697,1	5716773,0	93,04	80,99	82,93	1,94	81,53	81,19	81,32	81,02	80,99
GWM 7.02	4516700,1	5716640,1	94,34	83,46	84,55	1,09	83,93	83,75	83,57	83,49	83,46
GWM 8.02	4516984,3	5717110,8	93,68	81,90	83,08	1,18	82,42	82,18	82,05	81,95	81,90
GWM 9.02	4517276,2	5717602,3	94,39	82,42	84,32	1,90	83,04	82,84	82,83	82,42	82,67
Pegel 101	4517113,5	5717311,0	95,16	81,77	84,90	3,13	82,68	82,16	81,99	81,90	81,77
Pegel 102	4516729,8	5716634,3	93,41	88,26	90,10	1,84	88,26	89,29	89,04	88,43	88,27
LMBV 306	4518157,3	5717234,4	89,10	72,40	72,86	0,46	72,73	72,40	72,65	72,69	72,71
GWM LHW	4517488,0	5716458,0	93,65	82,10	83,26	1,16	82,40	82,33	82,24	82,14	82,10

Grundwasserstände IV-2019 mit Bezug auf den seit II-2014 beobachteten Grundwasserschwankungsbereich:

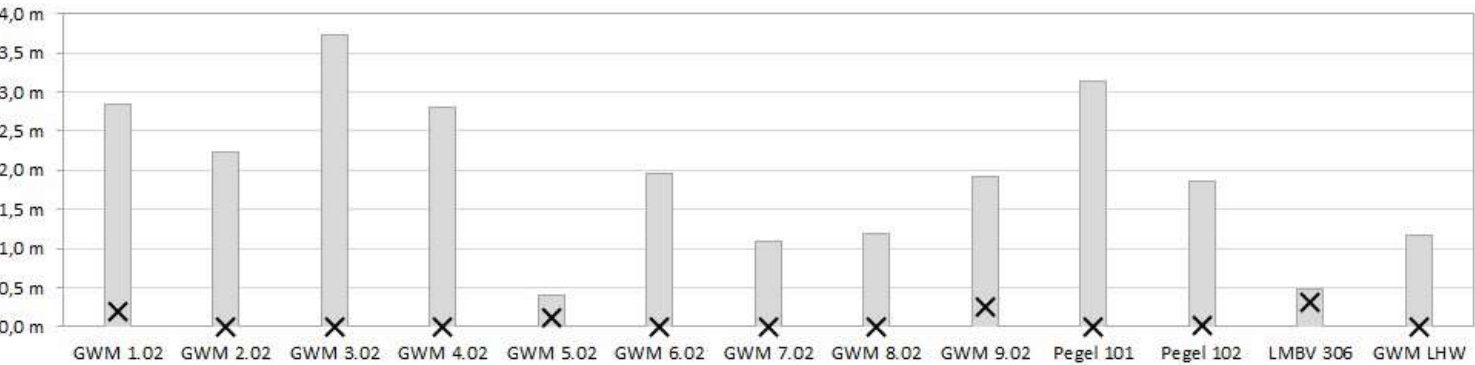

Projekt:	Errichtung Deponie DK I in Roitzsch	Auftraggeber:		GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH	
		Lagestatus:		LS 110	
Projekt-Nr.:	kl-001/01/16	Höhenstatus:		DHHN 92 (NHN)	
		Bearbeiter:		Köhler	
		Datum:		2019	
		Anlage:		1, Blatt 1	
Grundwasser und Messstellen Hydroisohypsenplan "Oberer Grundwasserleiter" Stand 2019		Baugrundbüro Klein Hummelweg 3 06120 Halle / Dölau Tel.: +49 (0)345 / 532 36 90 E-Mail: info@baugrundbuero-klein.de		<div><div>BERATENDE INGENIEURE</div><div>BAUGRUNDBUERO</div><div></div></div>	
