


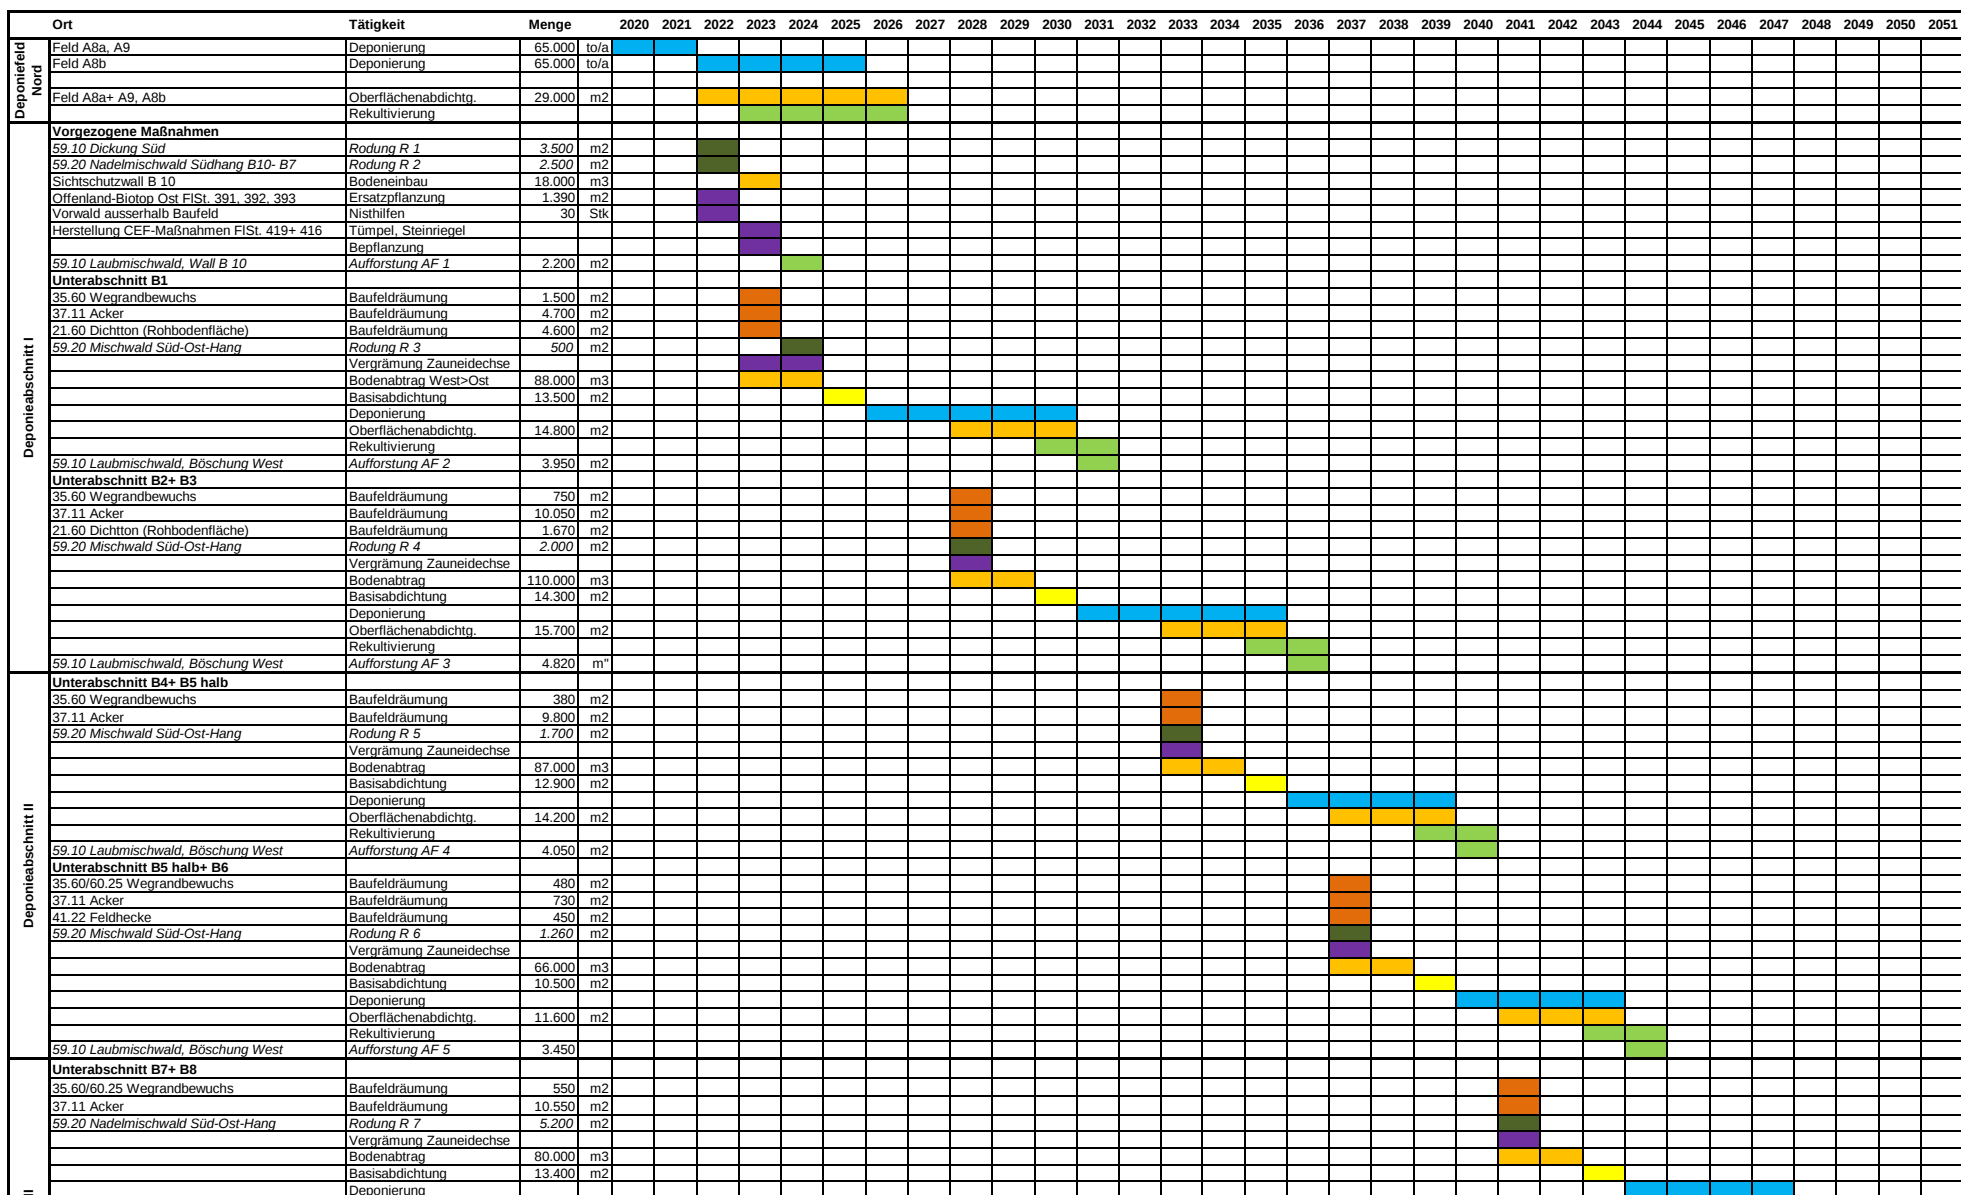

Deponierung Abdichtung Bodenabtrag/auftrag Baufeldräumung Rodung Rekultivierung Tiefbau Arten- u. Biotopschutz

Ort	Tätigkeit	Menge	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051
Deponieabschnitt I	Oberflächenabdichtg.	14.700 m2																																
	Rekultivierung																																	
	59.10 Laubmischwald, Süd-Ost B6 bis B10	Aufforstung AF 6	2.500 m2																															
	59.10 Laubmischwald, Böschung West	Aufforstung AF 7	5.570 m2																															
	Unterabschnitt B9+ B10																																	
	35.60/60.25 Wegrandbewuchs	Baufeldräumung	680 m2																															
	37.11 Acker	Baufeldräumung	9.000 m2																															
		Vergrämung Zauneidechse																																
		Bodenabtrag	63.000 m3																															
		Basisabdichtung	9.000 m2																															
		Deponierung																																
		Oberflächenabdichtg.	10.000 m2																															
		Rekultivierung																																
	59.10 Laubmischwald, Böschung West	Aufforstung AF 8	4.250 m2																															
	59.10 Laubmischwald, Böschung West, Wall	Aufforstung AF 9	2.530 m2																															

Tiefbau der Schmutzwasserleitung nach Neufra	Herstellung Sickerbecken XXI	Rodung Feldhecke	1.000 m2																															
		Sickerbecken	2.000 m2																															
	B 6 bis Deponiefeld Nord	Bituminöser Weg	390 m																															
	B 6 bis B 10	Bituminöser Weg	260 m																															
	Haltung 247- 241	Rohrleitung DN 250	320 m																															
	Haltung 240- 230	Druckleitung DA 110	460 m																															
	Über Weiher I, III Ost, IV	Rodung Feldgehölz	980 m2																															
	Haltung 230- 201	Doppelleitung DN 300	190 m																															
	Unterabschnitt B1	Rodung Feldgehölz	120 m2																															
	Anschluss an Doppelleitung	Teilsickerleitung DN 250																																
	Unterabschnitt B2+ B3	Rodung Feldgehölz	200 m2																															
	Anschluss an Doppelleitung	Teilsickerleitung DN 250																																
	Unterabschnitt B4+ B5 halb	Rodung Feldgehölz	250 m2																															
	Anschluss an Doppelleitung	Teilsickerleitung DN 250																																
	Unterabschnitt B5 halb+ B6	Rodung Feldgehölz	130 m2																															
	Anschluss an Doppelleitung	Teilsickerleitung DN 250																																
	41.22 Feldhecke (Biotop 178224260159)	Rodung Feldhecke	3.000 m2																															
	Haltung 230- 210	Doppelleitung DN 300	180 m																															

Martin Baur GmbH
Bauschuttdeponie Klasse I
88499 Riedlingen- Neufra

Balkendiagramm
Deponiefeld "Süd"

gefertigt

Dezember 2021

Dipl.- Ing. (FH) Landespflege
Karin Schmid

Dipl.- Ing. (FH) Bauingenieur
Thomas Braunsberg
