

GUTACHTERLICHE PROJEKTBEGLEITUNG	BEWEISSICHERUNG	WERT UND SCHADEN	SIGECO
ERD- UND HOCHBAU	UMWELTSCHUTZ	RÜCKBAU	ENTSORGUNG
			KAMPFMITTEL

S B U, Sulniac-Weg 12, 27478 Cuxhaven

Landkreis Wittmund  
**Herr Coordes**  
Schloßstr. 9, Gebäude III  
  
26409 Wittmund

HAMBURG  
BREMERHAVEN  
CUXHAVEN

## Endabnahme der abbruchbedingten Verfüllungen bei Sandabbau Adorf – Hohebarg

Cuxhaven, 02.10.2000  
130GU-9

Sehr geehrter Herr Coordes,

entsprechend den Ausführungen im „Gutachten zur Standfestigkeit der Uferverfüllung an der Straße „Am Rillenmoor“ an der Bodenabbaustätte Adorf-Hohebarg“ GU 130-3 vom 01.04.99 wurde im Bereich der markierten **Karte 1** Lehm Boden eingebaut.

Die Qualität des Einbaus wurde am 05.09.00 durch den Sachverständigen vor Ort überprüft (Fotos).

Im Zuge der Ortsbegehung wurden die Breiten (die Tiefen wurden vorher von Fa. Siebels gemessen) des eingebauten Lehm Bodens überprüft und in die Skizze (Karte 2) eingetragen.

**Anhand der Ergebnisse ist festzustellen, daß der Einbau des geforderten Lehm Bodens zur  
Sicherung der Abbaustätte vor weiteren Abbrüchen erfüllt wurde.  
Die Grube ist für den weiteren Abbau freizugeben.**


Im Hinblick auf die abschließende Uferneigung wird z.Z. ein Gutachten auf der Basis durchgeführter Scherversuche erstellt.

Mit freundlichen Grüßen

  
Dr.-Ing. P.J. Wagner  
Geschäftsführer



Karte 1 mit Übersichtsskizze und Verfüllungsbereich

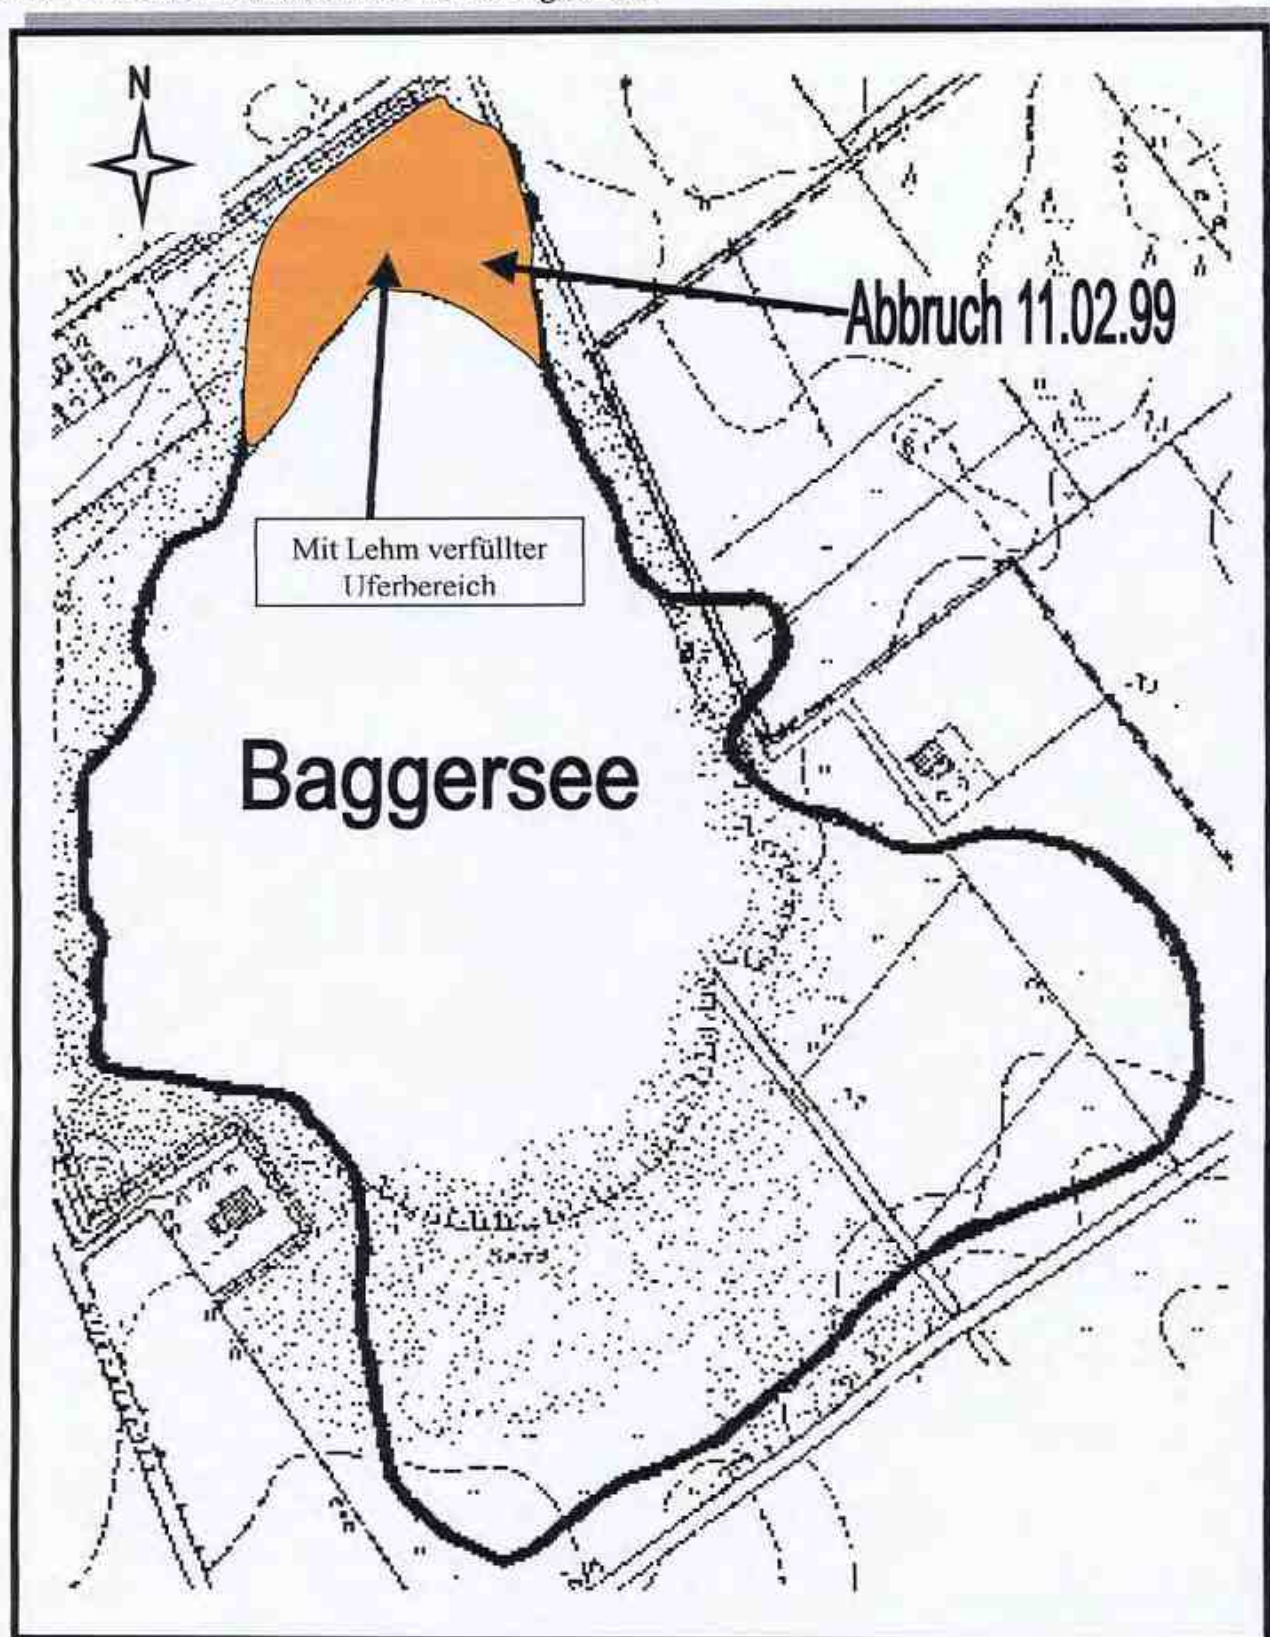



**Bilder von der Ortsbesichtigung am 05.09.00**

Blick nach Osten auf den nördlichen Uferabschnitt unmittelbar neben Straße „Am Brillenmoor“.



Blick nach Norden entlang des östlichen Uferabschnitts in Richtung Straße „Am Brillenmoor“.



Karte 2 mit eingezeichneten Füllbreiten

