


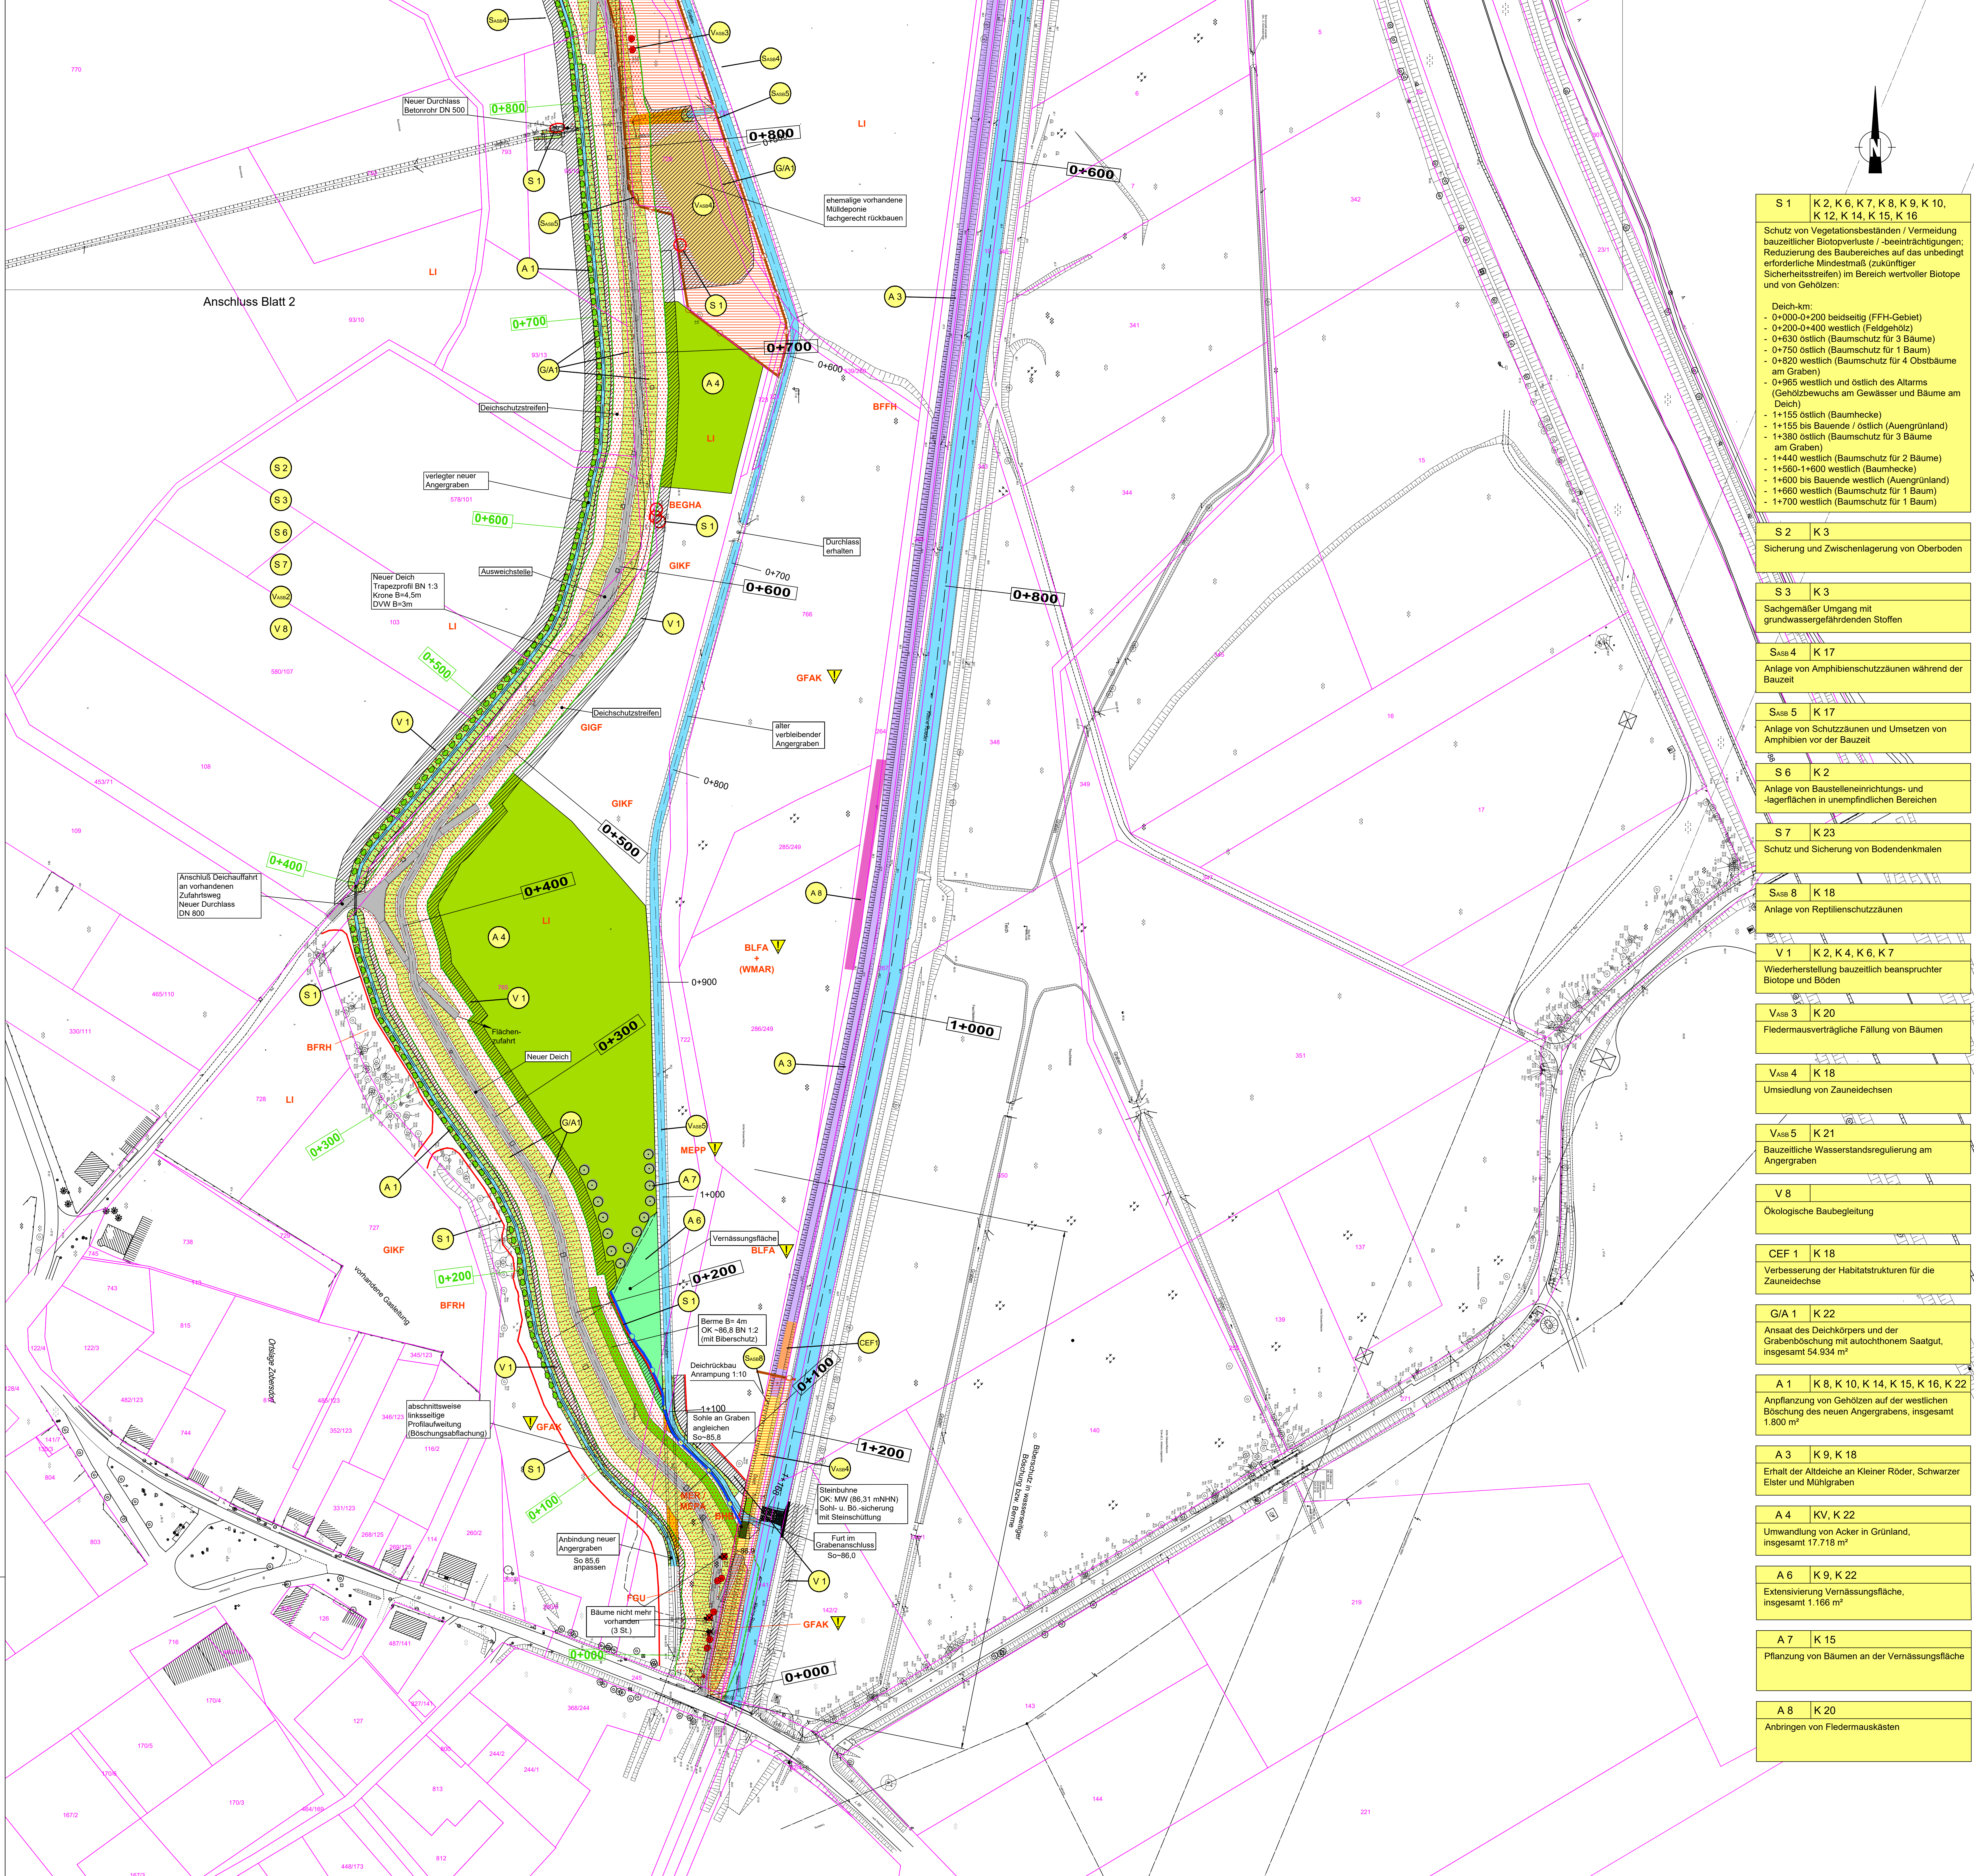

Maßnahmen

	Resenansaat
	Gehölzpflanzung
	Baumpflanzung
	Schutzzaun während der Bautätigkeit
	Einzelbaumschutz
	Anlage von Amphibienschutzzäunen
	Anlage von Reptilienschutzzäunen
	Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Flächen
	Umwandlung von Acker in Grünland
	Sukzessionsfläche
	Entwicklung von Auwald
	Anbringen von Fledermauskästen
	Anbringen von Nistkästen
	Unterhaltung Altdeich
	Umsiedlung von Zauneidechsen
	Verbesserung der Habitatstruktur für die Zauneidechse
	Anlage eines Zauneidechsenlebensraums
	Maßnahmenfläche A 2
	Amphibiensenken (je 100 m²)
	Biberrettungshügel

Nachrichtlich

Sanierung Deich Elsteraue

	Deichböschung
	Grabenböschung
	DW (Berme), Ausweichstelle, Zufahrten, Straßenanbindung (Asphaltbefestigung)
	Deichabtrag
	Zufahrtsweg
	Verfüllung
	Bankett
	Graben
	Deichschutzbereich (5 m)
	Baumfällung erforderlich
	Baum nicht mehr vorhanden
	Steinschüttung
	Berme (Rasengittersteine)

Weitere Vorhaben

Ortslagenplanung für Bad Liebenwerda im Bereich des Mühlgrabens (Ingenieurbüro Prokon Beratung und Planung GmbH)

Planung Ortsumgehung B 183 Bad Liebenwerda

Vermessung

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Maßnahmenplan

Maßnahmen Nr.	Bezug zur Konfliktnummer
A 2	K 17
Schaffung von Amphibiensukzessionsflächen unter Anlage von Senken	
S 2	K 3
Sicherung und Zwischenlagerung von Oberboden	
S 3	K 3
Sachgemäßer Umgang mit grundwassergefährdenden Stoffen	
S 4	K 17
Anlage von Amphibienschutzzäunen während der Bauzeit	
S 5	K 17
Anlage von Schutzzäunen und Umsetzen von Amphibien vor der Bauzeit	
S 6	K 2
Anlage von Baustelleneinrichtungs- und -lagerflächen in unempfindlichen Bereichen	
S 7	K 23
Schutz und Sicherung von Bodendenkmälern	
S 8	K 18
Anlage von Reptilienschutzzäunen	
V 1	K 2, K 4, K 6, K 7
Wiederherstellung bauzeitlich beanspruchter Biotope und Böden	
V 3	K 20
Fledermausverträgliche Fällung von Bäumen	
V 4	K 18
Umsiedlung von Zauneidechsen	
V 5	K 21
Bauzeitliche Wasserstandsregulierung am Angergraben	
V 8	
Ökologische Baubegleitung	
CEF 1	K 18
Verbesserung der Habitatstrukturen für die Zauneidechse	
G/A 1	K 22
Ansaat des Deichkörpers und der Grabenböschung mit autochthonem Saatgut, insgesamt 54.934 m²	
A 1	K 8, K 10, K 14, K 15, K 16, K 22
Anpflanzung von Gehölzen auf der westlichen Böschung des neuen Angergrabens, insgesamt 1.800 m²	
A 3	K 9, K 18
Erhalt der Altdeiche an Kleiner Röder, Schwarzer Elster und Mühlgraben	
A 4	KV, K 22
Umwandlung von Acker in Grünland, insgesamt 17.718 m²	
A 6	K 9, K 22
Extensivierung Vernässungsfläche, insgesamt 1.166 m²	
A 7	K 15
Pflanzung von Bäumen an der Vernässungsfläche	
A 8	K 20
Anbringen von Fledermauskästen	

Legende

Höhensystem: DHHN 92

Lagesystem: ETRS 89

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name	Unterschrift
Förster Planungsbüro Dudenstr. 15 10585 Berlin Tel.: 030 789903-96 Fax: -97				
bearbeitet		10/2020	gezeichnet	10/2020
geprüft		10/2020	geprüft	10/2020

Landesamt für Umwelt
Referat W 21 - Hochwasserschutz, Investiver Wasserbau
Seeburger Chaussee 2, 14476 Potsdam, OT Groß Glienicke

Sanierung des Deiches Elsteraue - Hochwasserschutz Kleine Röder, KR 31

Unterlagen Nr.: 13.5
Blatt-Nr.: 3
Bau-km:

Landschaftspflegerischer Begleitplan

geprüft

Datum

Name

Unterschrift

Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen, trassennah

Maßstab

1 : 1.000
