Bauablaufplan
Verbundprojekt Hochwasserschutz Boizenburg

Ramboll | iKD

Nr.	Task Name	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	**Naturschutzfachliche Einschränkungen**	**1065 d**	**Mit 01.03.23**	**Mit 31.03.27**	
2	Brutzeit 2023	157 d	Mit 01.03.23	Don 31.08.23	
3	Rastzeit Zugvögel 2023/2024	130 d	Mit 01.11.23	Son 31.03.24	
4	Brutzeit 2024	157 d	Fre 01.03.24	Sam 31.08.24	
5	Rastzeit Zugvögel 2024/2025	128 d	Fre 01.11.24	Mon 31.03.25	
6	Brutzeit 2025	157 d	Sam 01.03.25	Son 31.08.25	
7	Rastzeit Zugvögel 2025/2026	128 d	Sam 01.11.25	Die 31.03.26	
8	Brutzeit 2026	157 d	Son 01.03.26	Mon 31.08.26	
9	Rastzeit Zugvögel 2026/2027	129 d	Son 01.11.26	Mit 31.03.27	
10					
11	**BAUABSCHNITT 1**	**543 d**	**Mit 04.10.23**	**Fre 31.10.25**	
12	Baufeldfreimachung Deichneubautrasse	1 Monat	Mit 04.10.23	Die 31.10.23	
13	Baustart BA 1	0 d	Mon 01.04.24	Mon 01.04.24	3
14	Neubau Alststadtdeich Abschnitt Süd (ganzer RQ)	154 d	Mon 01.04.24	Don 31.10.24	13
15	Erhöhung Hafendeich Ost	30 d	Fre 01.11.24	Don 12.12.24	14
16	Erhöhung Hafendeich West	25 d	Fre 13.12.24	Don 16.01.25	15
17	Anschluss Altstadtdeich an Hafendeich	25 d	Fre 17.01.25	Don 20.02.25	16
18	Ertüchtigung Schöpfwerk Boizenburg	90 d	Fre 21.02.25	Don 26.06.25	17
19	Neubau Alststadtdeich Abschnitt Nord	134 d	Die 01.04.25	Fre 03.10.25	
20	"BauHW Deich" (10,25 mNHN)	45 d	Die 01.04.25	Mon 02.06.25	5;14
21	Abtrag rechter Sudedeich	80 d	Die 03.06.25	Mon 22.09.25	20
22	Erweiterung/Ausbau Abschnitt Nord auf ganzen RQ	89 d	Die 03.06.25	Fre 03.10.25	20
23	Restarbeiten/Erstellung Schlussrechnung	1 Monat	Mon 06.10.25	Fre 31.10.25	22
24	Bauende BA 1	0 d	Fre 31.10.25	Fre 31.10.25	23
25					
26	**BAUABSCHNITT 2**	**470 d**	**Mon 01.04.24**	**Fre 16.01.26**	
27	Baustart BA 2	0 d	Mon 01.04.24	Mon 01.04.24	
28	Neubau Sude Hochwassersperrwerk	464 d	Mon 01.04.24	Don 08.01.26	27
29	Lückenschluss Sperrwerk - Altstadtdeich	5 Wochen	Mon 06.10.25	Fre 07.11.25	22
30	Restarbeiten	6 d	Fre 09.01.26	Fre 16.01.26	28
31	Bauende BA 2	0 d	Fre 16.01.26	Fre 16.01.26	30
32					
33	**BAUABSCHNITT 3**	**368 d**	**Die 31.03.26**	**Don 26.08.27**	
34	Baustart BA 3	0 d	Mit 01.04.26	Mit 01.04.26	
35	Rückbau/Abtrag Hafendeich Teil 1	154 d	Die 31.03.26	Fre 30.10.26	28;7;11
36	Rückbau/Abtrag Hafendeich Teil 2	76 d	Don 01.04.27	Don 15.07.27	9;35
37	Erhöhung Elbedeich Boizenburg	65 d	Die 31.03.26	Mon 29.06.26	35AA
38	Erhöhung Elbedeich Mahnkenwerder Teil 1	89 d	Die 30.06.26	Sam 31.10.26	37
39	Erhöhung Elbedeich Mahnkenwerder Teil 2	86 d	Don 01.04.27	Don 29.07.27	9;38
40	Restarbeiten	1 Monat	Fre 30.07.27	Don 26.08.27	39
41	Bauende BA 3	0 d	Don 26.08.27	Don 26.08.27	40

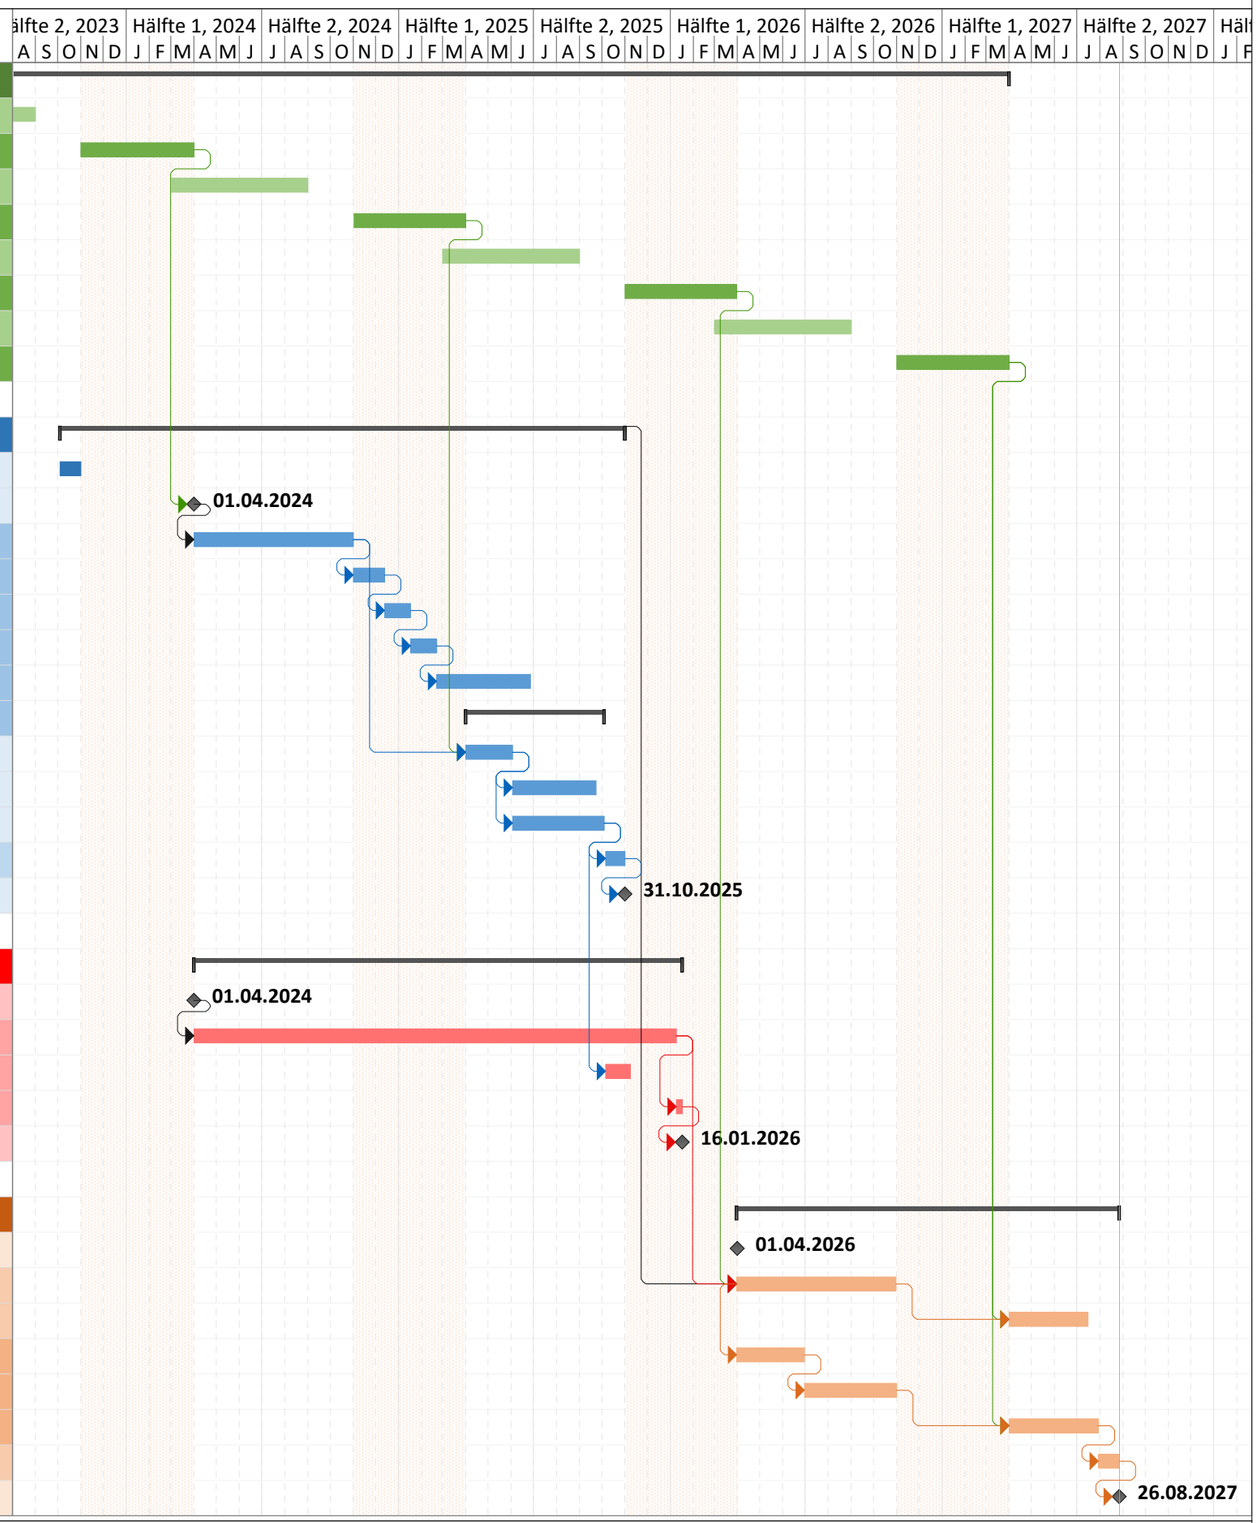

Stand: Die 05.10.21
\\RAMHHAFILE10\DATA\10-Projekte\0506_Hochwasserschutz Boizenburg\4 Entwurf_Genehmigung\43 Objektplanung\432 Bauablaufplanung\Bauablauf HWSB_ohne Planungszeiträume_rev3.mpp
