Bauzeitenplan
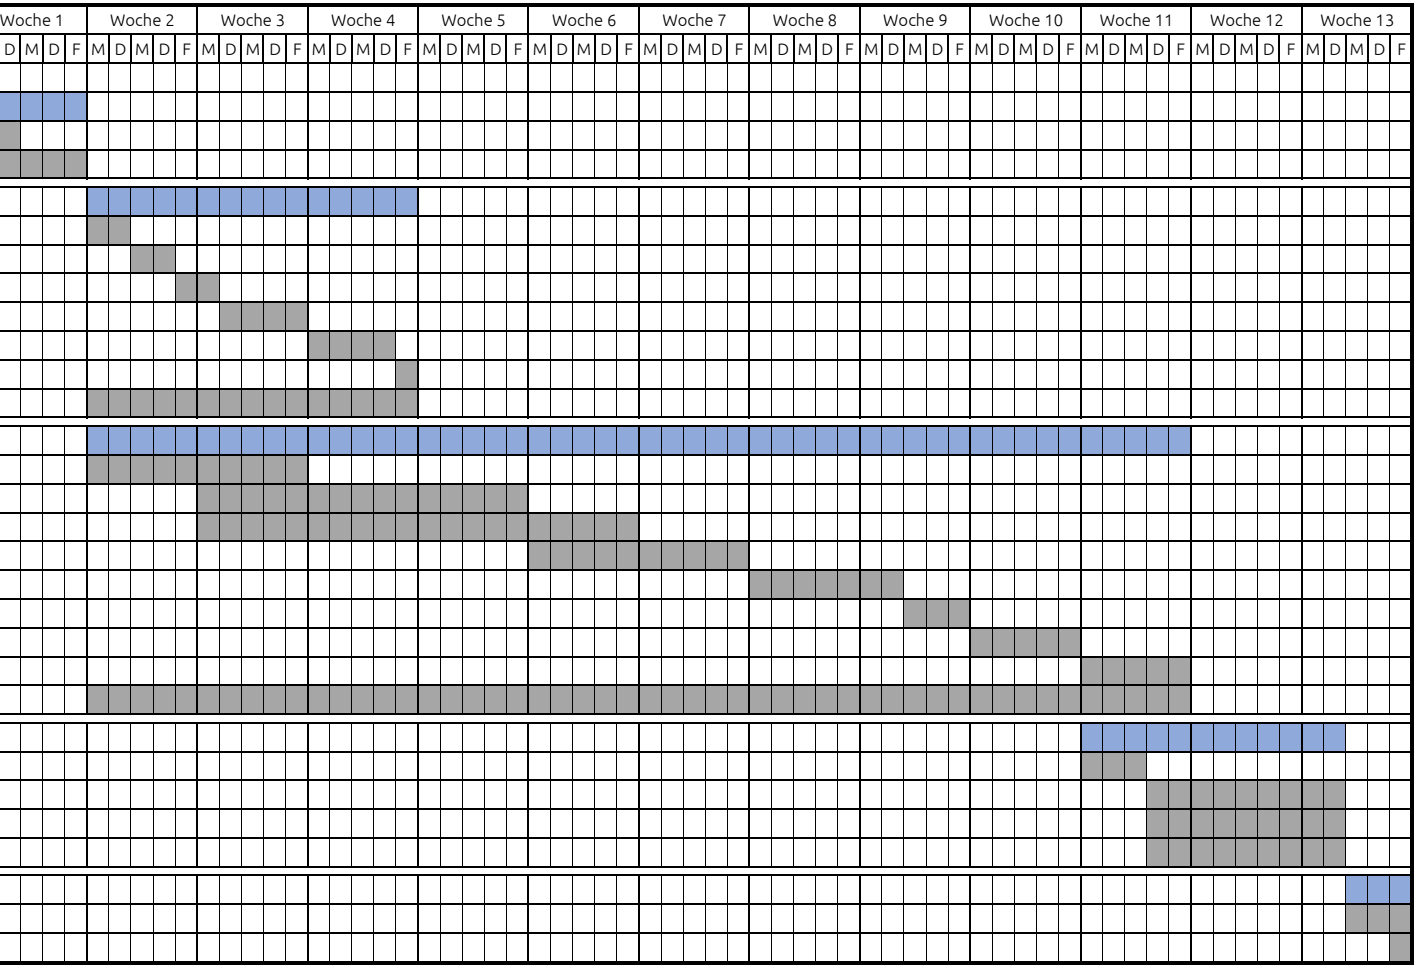
	Aufgabe	Dauer AT
1	**Baustelleneinrichtung**	**5 AT**
1.1	Baustelleneinrichtung	2 AT
1.2	Vorbereitende Maßnahmen	4 AT
2	**Rückbau Gebäude C**	**15 AT**
2.1	Schadstoffausbau	2 AT
2.2	Rückbau TGA	2 AT
2.3	Entkernung	2 AT
2.4	Rückbau Gebäudehülle	4 AT
2.5	Tiefenentrümmerung	4 AT
2.6	Einebnung Baufeld	1 AT
2.7	Entsorgung	15 AT
3	**Rückbau Gebäude D**	**50 AT**
3.1	Schadstoffausbau	10 AT
3.2	Rückbau TGA	15 AT
3.3	Entkernung	20 AT
3.4	Rückbau Gebäudehülle	10 AT
3.5	Tiefenentrümmerung	7 AT
3.6	Einrichten Verbau	3 AT
3.7	Rückbau Arbeitsgrube	5 AT
3.8	Einebnung Baufeld	5 AT
3.9	Entsorgung	50 AT
4	**Rückbau Schornstein**	
4.1	Aufbau Arbeits- u. Schutzgerüst	3 AT
4.2	Rückbau Schornstein ohne Fund.	10 AT
4.3	Abbau Arbeits- und Schutzgerüst	10 AT
4.4	Entsorgung	10 AT
5	**Baustelle räumen**	**3 AT**
5.1	Baustelle räumen	3 AT
5.2	Endreinigung	1 AT
